




تواصلوا . ابنوا . صمموا . تفاعلوا . المدارس الحكومية في مقاطعة برنس جورج . PGCPS



مدرسة وليام ويرت التكميلية

في ٢٤ أيلول (سبتمبر) عند الساعة ٧,٠٠ مساءً | اجتماع تحديث المشروع



DEPARTMENT OF
CAPITAL PROGRAMS
PRINCE GEORGE'S COUNTY PUBLIC SCHOOLS



CR Crabtree, Rohrbaugh & Associates
Architects
401 East Winding Hill Road
Mechanicsburg, Pennsylvania 17055
phone: (717) 458-0272 - fax: (717) 458-0047

الترجمة الفورية

اللغة الإسبانية:

El servicio de interpretación simultánea está disponible en español. Haga clic en el icono del globo terráqueo en la parte inferior de la pantalla y seleccione **Spanish** (español).

اللغة العربية:


الترجمة الفورية متوفرة باللغة العربية. اضغط على ايقونة الكرة الأرضية أسفل الشاشة وحدد العربية.

اللغة الداربية:

ترجمه همزمان به زبان دری موجود است. روی نماد کره در پایین صفحه کلیک کنید و را انتخاب کنید. (ترجمه به دری)

لغة الباشتو:

په پښتو کې یو شان تفسیر شتون لري. د سکرین په پای کې د گلوب عکس کلیک وکړئ او پښتو غوره کړئ. (په پښتو ژباړه)



نحن نقدر مداخلتكم.

- يرجى كتابة أسئلتكم/تعليقاتكم في منطقة الأسئلة والأجوبة في زوم (Zoom)
- سيتم نشر الأسئلة والإجابات من الجلسة المفتوحة هذه على صفحة مشروع المدرسة على bit.ly/DCP-WilliamWirt





التزامنا

تعمل المدارس الحكومية في مقاطعة برنس جورج بسرعة لتوفير بيئات تعليمية آمنة، وحديثة، ومستدامة لطلابنا، ومعلمينا، ومجتمعاتنا. من خلال نهج ثلاثي الجوانب، تحسين رأس المال التقليدي، والتجديدات المرحلية، وأول نهج شراكة بين القطاعين العام والخاص لتصميم وبناء وصيانة للمدارس الحكومية في البلاد، والمعروف باسم برنامج مدارس المخطط، نحن في طريقنا لتقديم أكثر من ٢٥ منشآت مدرسية حديثة في عشر سنوات فقط.



جدول الأعمال

- فريق العمل
- الجدول الزمني للمشروع
- مراجعة نطاق المشروع ومراحله
- تحديث البناء
- أسئلة وأجوبة

فريق العمل

إدارة برامج رأس المال للمدارس الحكومية في مقاطعة برنس جورج

- السيد الدكتور/شاروسكار كولمان، الرئيس التنفيذي للعمليات
- جيسون واشنطن، المشرف المساعد على خدمات الدعم
- شيلا جاكسون، المديرية
- ويل سميث، المشرف على إدارة المشاريع
- هنري لويس، مدير المشروع

الأخوين كيلبي

- جاستن شورت، المدير التنفيذي للمشروع
- ألكس منكبي، مساعد مدير المشروع

كرايتري، روهربوغ وشركاه للهندسة المعمارية

- سيث وينز، مهندس المشروع

مدرسة وليام ويرت التكميلية

- روندا سيملي، المديرية

مكتب النقل للمدارس الحكومية في مقاطعة برنس جورج

- كيبا بالدوين، المدير

الجدول الزمني للمشروع

طاقة كهربائية دائمة	تشرين الثاني (نوفمبر) ٢٠٢٣
المرحلة الأولى الإنجاز الأساسي	آب (أغسطس) ٢٠٢٣
المرحلة الثانية الإنجاز الأساسي	تموز (يوليو) ٢٠٢٤
الانتقال إلى المبنى الجديد والعمل فيه	العام الدراسي ٢٠٢٤-٢٠٢٥
المرحلة الثالثة الإنجاز الأساسي	كانون الثاني (يناير) ٢٠٢٥
المرحلة الرابعة الإنجاز الأساسي	حزيران (يونيو) ٢٠٢٥
اكتمال المشروع بصورة نهائية، بما في ذلك العمل في الموقع	تموز (يوليو) ٢٠٢٥




نطاق المشروع

مراحل المشروع

المرحلة الثالثة وهي تتألف من قطع الاتصال بالمرافق وهدم مبنى المدرسة القائم.

المرحلة الرابعة وهي تشمل الانتهاء من جميع أعمال الموقع بما في ذلك الانتهاء من تركيب نظام مياه الأمطار، وهياكل الاحتفاظ البيولوجي، وملعب كرة جديد، ومقاعد مدرج، وممر دائري جديد للحافلات، وملاعب معبدة حديثاً، وسياج، وموقف سيارات جديد مع إمكانية الوصول إلى شارع تاكرمان.

PHASES 3 & 4

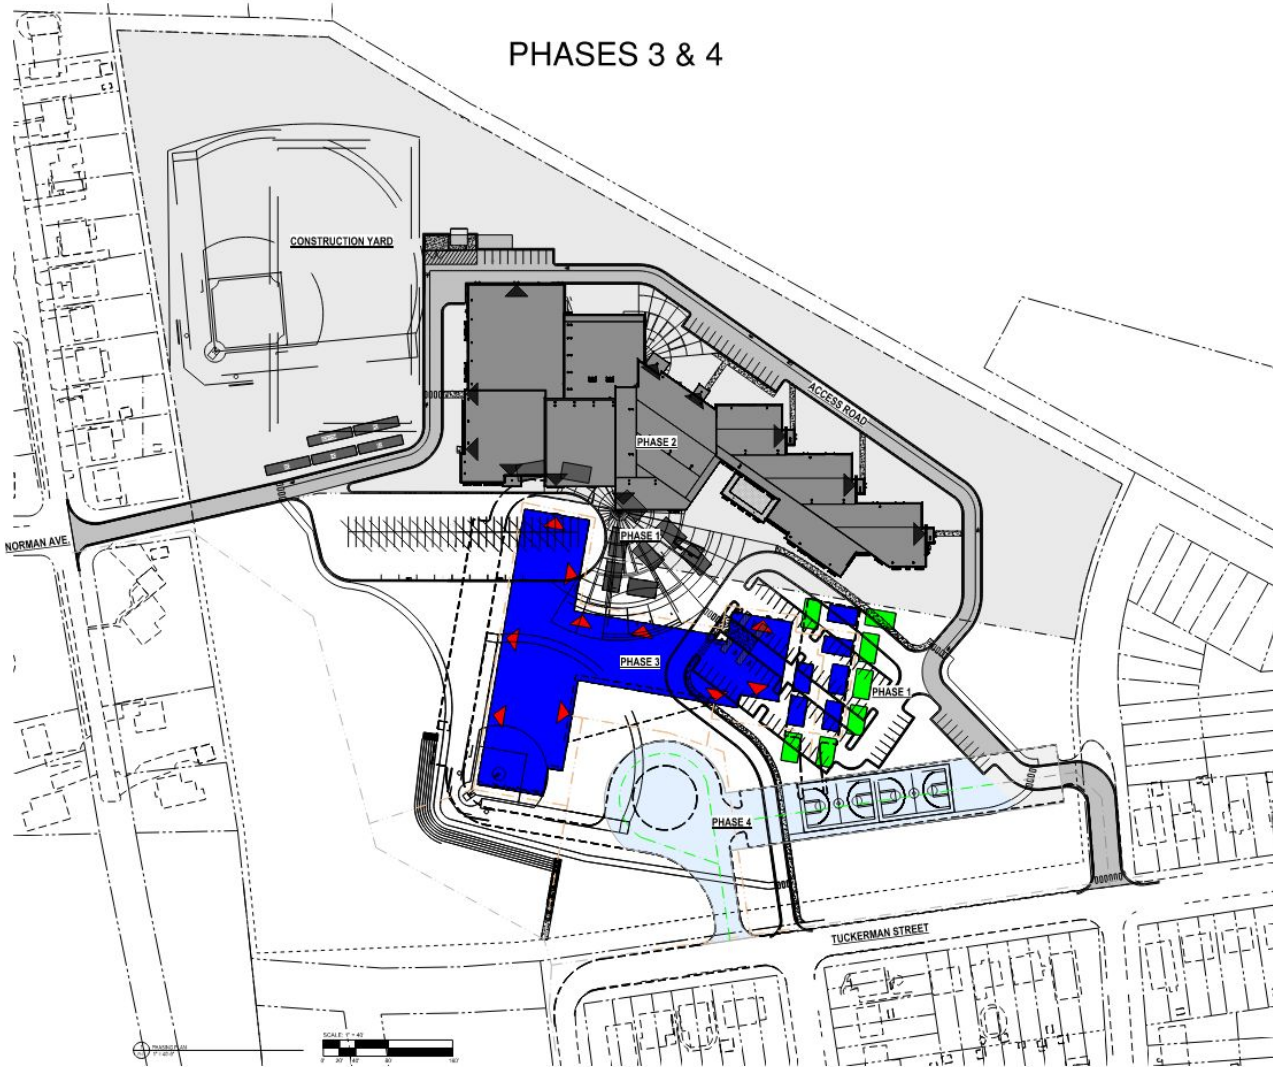

نطاق المشروع



مخطط الموقع

نطاق المشروع

GRAPHIC LEGEND

-  MAIN ENTRY / VISITOR ENTRY
-  SECONDARY ENTRY / BUS ENTRY
-  COMMUNITY USE ENTRY & PARKING
-  REAR ENTRY
-  BUS DROP-OFF
-  PARENT DROP-OFF
-  DELIVERIES
-  WASTE STORAGE
-  TRAFFIC GATE



مخطط الموقع

نظرة عامة للبناء

الخطوات القادمة	البناء الجاري	الإنجاز الرئيسي للبناء
الانتهاء من المرحلة الرابعة في حزيران (يونيو) ٢٠٢٤	تركيب أرضية الصالة الرياضية	تم منح الإشغال كما تم منح الطلاب والموظفين الاستخدام الكامل للمدرسة الجديدة!
اكتمال المرحلة الرابعة من المشروع الذي يتضمن بناء هدم المدرسة القديمة وملاعب رياضية متعددة ومواقف للسيارات حيث توجد المدرسة الحالية	تخفيض المدرسة القديمة	
اكتمال المشروع بصورة نهائية في تموز (يوليو) ٢٠٢٥	مراقبة وتركيب الجدران الاستنادية وملعب البيسبول في منطقة انطلاق البناء	
	تثبيت المدرج لاحقاً، بمجرد ضبط أرضية صالة الألعاب الرياضية وتجفيفها	

نظرة عامة للبناء



لوحة جدارية لنمر مدرسة وليام ويرت التكميلية



المنظر من المدخل الخلفي

نظرة عامة للبناء



تركيب صالة ألعاب رياضية جديدة



ظلي أرضية صالة الألعاب الرياضية

نظرة عامة للبناء



الكافتيريا الجديدة



إعداد الموقع للجدار الاستنادي وبناء ملعب البيسبول

أسئلة وأجوبة

يرجى كتابة أسئلتكم/تعليقاتكم في منطقة الأسئلة والأجوبة في زوم (Zoom)



شكراً!

لتقديم أسئلة إضافية ولمشاهدة عرض اليوم، قوموا بزيارة الصفحة الشبكية للمشروع على العنوان التالي:

capital.programs@pgcps.org أو أرسلوها على العنوان البريدي الإلكتروني bit.ly/DCP-WilliamWirt

لتلقي أخبار الإدارة وتحديثاتها، الرجاء الانضمام إلى القائمة البريدية على العنوان التالي: bit.ly/DCP-Mailing أو

مسح رمز الاستجابة السريعة أدناه.

